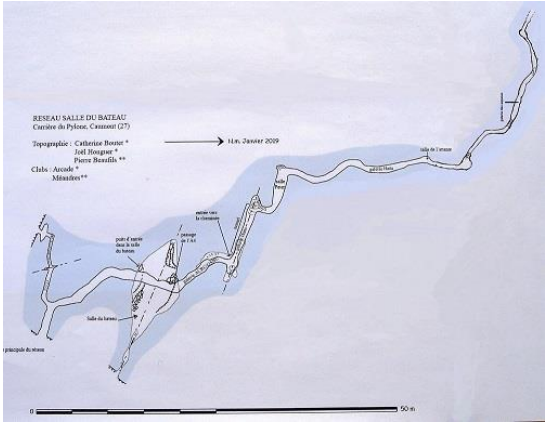

COLLECTIF DE TRAVAIL COMMISSION RESEAU SALLE DU BATEAU

Clubs participants en 2022

SSPC SCOF

Méandres ESH

Sortie du : 26-11-2022 **De :** 8h **à** 16H30

Présents : Pierre Beaufils, Chloé Quéraud Guérin, le mécano, Laurence Salaüne

Aujourd'hui nous poursuivons encore un peu le dressage du sol et posons enfin le cheminement en tôle du méandre d'entrée. Pendant que Laurence et le mécano finissent le dressage, je découpe les tôles au lapidaire. Nous avons descendu le groupe électrogène du mécano. Les tôles sont posées et rivetées. Un traitement à la flamme et un badigeonnage de produit préventif et fait sur les champignons dans la galerie Hans, espérons que cela s'arrêtera là. Les supports et le caillebotis à l'entrée du tunnel sont mis de niveau, nous pourrons par la suite creuser le puits (environ 1,50m, mais dans des blocs d'effondrement).

De nouveau l'eau est réapparue, et stagne à l'entrée du tunnel. L'entrée du réseau reste très boueuse. Je pense que malgré nos améliorations il nous faudra toujours faire avec ces molécules H2O, mais sans elle nous n'aurions pas ce vide Souterrain et ne serions pas là… !

Pierre

Prochaine séance : le samedi 10 décembre à partir de 8h pour reprise de désob au front de taille galerie des espaces.
